

PRESUPUESTO DEL PROYECTO



PRESUPUESTO



Tipos de costos:

- **Costos Directos:** Los directamente atribuibles al Proyecto.
- **Costos Indirectos:** Aquellos necesarios para el proyecto, pero no restringidos a el Ej: Alquiler de oficinas, electricidad, etc.
- **Costos Fijos:** Aquellos que son constantes en un proyecto sin importar cuanto son usados. Ej. El diseño de una bomba
- **Costos Variables:** Aquellos que fluctúan con lo producido Ej. los costos de producción de una bomba

PRESUPUESTO

Tipos de costos:


Los costos de las actividades se estiman para todos los recursos que se van a cargar al proyecto, Incluyendo

- Recurso Humano / Mano de Obra
- Materiales y Suministros
- Maquinaria y Equipos
- Servicios
- Edificios
- Costos financieros, Inflación, Contingencia

PRESUPUESTO

Tipos de costos:

Las estimaciones se van refinando, en forma progresiva, durante el desarrollo del proyecto

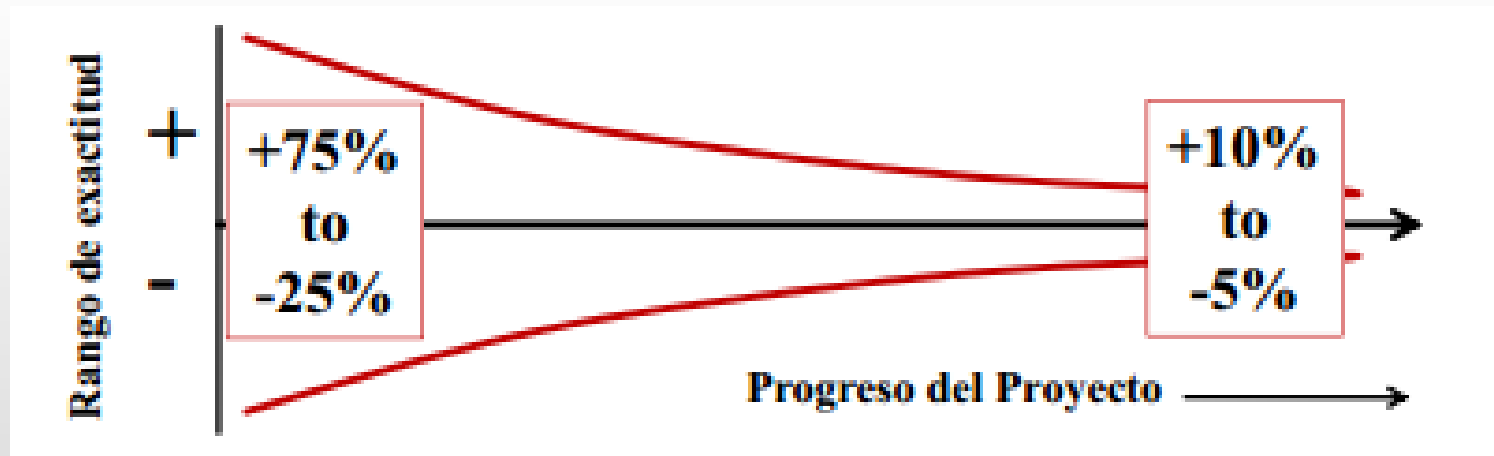

PRESUPUESTO

Estimaciones de costos:

- Estimación Análoga
- Estimación ascendente
- Estimación Paramétrica
- Estimación de los tres puntos
- Análisis de reserva

PRESUPUESTO

Análisis de Reserva:

Reservas de contingencia: Son los costos estimados para cubrir los **riesgos identificados**.

Bases de Estimación:

- Procedimiento del desarrollo del estimado.
- Supuestos realizados.
- Restricciones conocidas.
- Rango de exactitud realizado.

PRESUPUESTO

Determinación de Presupuesto


Agregado (SUMA) de costos:

Los estimados de costos de las actividades se agregan, de acuerdo con la WBS, para obtener los estimados de costos de:

- Paquetes de trabajo
- Fases
- Proyecto

PRESUPUESTO

Línea base de costo

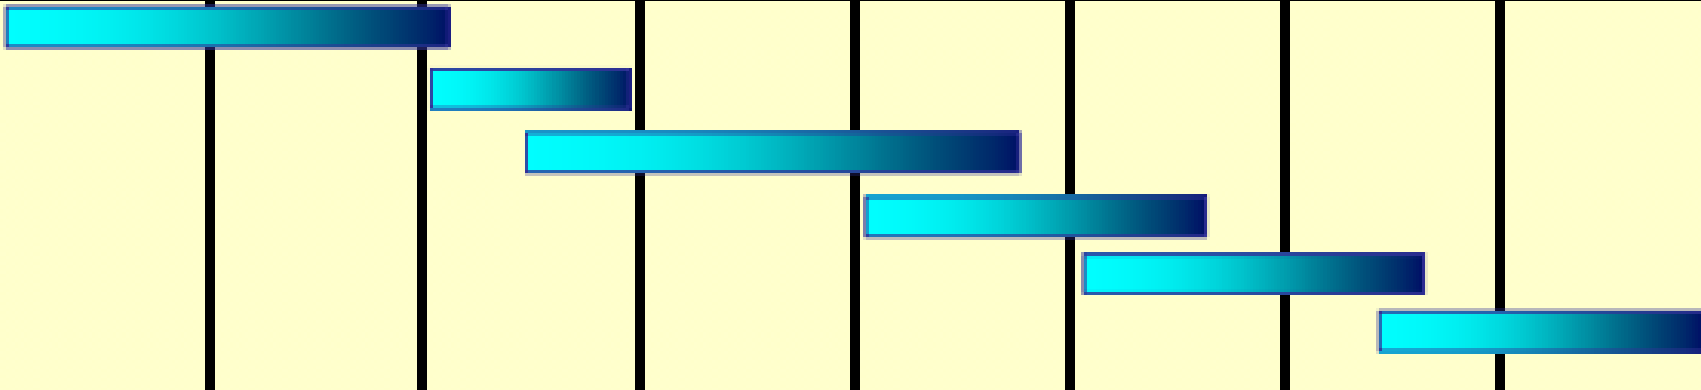Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
							
200	200	10					
		350					
		240	500	440			
				600	400		
					200	120	
						200	400
200	200	600	500	1040	600	320	400
200	400	1000	1500	2540	3140	3460	3860

PRESUPUESTO

Línea base de costo

